

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo číslo PPR-32148-10/ČJ-2013-990656 uzavřené dne 28.8.2014

(dále jen „Smlouva“)

Číslo smlouvy/dodatku Objednatele: PPR-32148-32/ČJ-2013-990656

Číslo smlouvy/dodatku Zhotovitele: CWR023/1

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

IČO: 00007064

DIČ: CZ00007064

Bankovní spojení: ČNB Praha 1

Číslo účtu: 5504881/0710

Zastoupená: Ing. Miroslavem Hajným, ředitelem Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR

(dále jen „MV ČR“ nebo „Objednatel“)

a

IBM Česká republika, spol. s r.o.

V Parku 2294/4, 148 00 Praha 4

Registovaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 692

IČO: 14890992

DIČ: CZ14890992

Bankovní spojení: ČSOB Praha 1, Na příkopě 14, Praha 1

Číslo účtu: 56733/0300

zastoupená: Radkem Hovorkou, jednatelem společnosti

(dále jen „IBM“ nebo „Zhotovitel“)

Vzhledem k tomu, že na základě požadavku Objednatele je nezbytné rozšířit předmět smlouvy a zároveň upravit časový průběh realizace předmětu plnění Smlouvy, smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením článku XI. Smlouvy, evidované u Objednatele pod č.j. PPR-32148-10/ČJ-2013-990656 a evidované u Zhotovitele pod č. CWR023 na jejích následujících změnách:

Změny ve VIS MAIL II požadované objednatelem pro spuštění VIS MAIL II do provozu:

- a. Nebude realizována funkcionalita Speciální storno viz odstavec 1.5.3 Přílohy č.1 Smlouvy
- b. Předmět smlouvy bude rozšířen o realizaci následujících změnových požadavků:
 - Interní směrování zpráv ve VIS MAIL
Změna ze směrování VIS Mail zpráv na základě ŽOV(žádost o vytvoření víza) na směrování na základě autority. Změna adresování se týká adresování příchozích zpráv, které jsou zpracovávány na VIS Mail aplikačním serveru.
 - Automatická aktualizace zahraničních LoA (list of authorities)
 - Poštovní notifikace ve VIS Mail
V případě příchozí VIS Mail zprávy typu 01-08, která přísluší na území, bude nově zasíláno avízo do jedné poštovní schránky (společné pro všechny notifikace)
 - Rozšíření VIS Mail o audit ws (webových služeb)
Bude zaveden audit ws VIS Mail s využitím auditního systému NS VIS - plnění stávajících tabulek NS VIS a využití funkcionality NS VIS
 - Prodloužení položky křestní jméno
Prodloužení položky v rozhraní EVC 2-NS VIS: položka FirstName o délce 25 znaků bude prodloužena na 50 znaků
 - Mapování autorit a útvarů
Změna pro případ, kdy je více autorit pro jeden útvar. Změna se týká mapování tří číselníků: Orgán, Útvar a ZÚ (zastupitelský úřad).

Zhotovitel se zavazuje v rámci této realizace pro Objednatele provést detailní analýzu, design, vývoj, testování a dokumentaci změn za podmínky a předpokladů uvedených v tomto dodatku.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Na konec odstavce 2 čl. II Předmět smlouvy se přidává nová odrážka následujícího znění:
 - Změny ve VIS MAIL II požadované objednatelem pro spuštění VIS MAIL II do provozu – detailní specifikace je uvedena v čl. 1.1 Přílohy č. 5 této Smlouvy.
2. Na konec čl. III Místo a termín plnění se přidává nový odstavec 4 následujícího znění:

4. Termíny plnění dílčí části Změny ve VIS MAIL II požadované objednatelem pro spuštění VIS MAIL II do provozu jsou uvedeny v čl. 1.2 Přílohy 5 této Smlouvy.
3. Na konec čl. VI Převzetí výsledků plnění se přidává nový odstavec 15 následujícího znění:

15. Přejímka dílčí části plnění Změny ve VIS MAIL II požadované objednatelem pro spuštění VIS MAIL II do provozu dle odstavce 2 čl. II Smlouvy je popsána v čl. 1.3 Přílohy č. 5 této Smlouvy.
4. Odstavec 1 čl. VII Cena a platební podmínky se nahrazuje novým zněním:
 1. Celková cena za předmět plnění dle čl. II této Smlouvy činí **30 524 702,00 Kč** bez DPH
(slovy třicet milionů pět set dvacet čtyři tisíc sedm set dva korun)

výše DPH činí: 21 %, tj. **6 410 187,42 Kč**.

tj. 36 934 889,42 Kč včetně DPH
(slovy třicet šest milionů devět set třicet čtyři tisíc osm set osmdesát devět korun 42 haléřů)

Ve výše uvedené celkové ceně je zahrnuta i cena dílčí části plnění Změny ve VIS MAIL II požadované objednatelem pro spuštění VIS MAIL II do provozu dle odstavce 2 čl. II této

Smlouvy, která činí 1 722 000,- Kč bez DPH. Detailní specifikace ceny včetně způsobu jejího placení je uvedena v čl. 1.4 Přílohy č. 5 této Smlouvy.

5. Odstavec 20 čl. XVII Všeobecná ustanovení se nahrazuje novým zněním:

20. Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří Přílohy 1 až 5:

Příloha č. 1: Detailní specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2: Rámcové termíny plnění

Příloha č. 3: Řídící struktura Projektu a řízení Projektu

Příloha č. 4: Součinnost Objednatele

Příloha č. 5: Detailní specifikace a podmínky plnění dílčí části Změny ve VIS MAIL II požadované Objednatelem pro spuštění VIS MAIL II do provozu

Příloha č.2 Smlouvy - „Rámcové termíny plnění“, se nahrazuje novým zněním, které je uvedeno v Příloze A tohoto Dodatku č. 1.

6. Přílohu B tohoto Dodatku č. 1 tvoří nová Příloha č. 5 Smlouvy – „Detailní specifikace a podmínky plnění dílčí části Změny ve VIS MAIL II požadované Objednatelem pro spuštění VIS MAIL II do provozu“.
7. Ostatní ustanovení Smlouvy a všechny její přílohy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny.
8. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel obdrží po dvou (2) stejnopisech tohoto Dodatku č. 1.
9. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a stává se nedílnou součástí Smlouvy.

Za Zhotovitele:

Pod

Za Objednatele:

Podpis c

8 -01- 2015

Datum

Jméno -7 -01- 2015 Datum

Příloha A Dodatku č. 1


Příloha č. 2 - Rámcové termíny plnění

Počet listů: 1

Rámcový harmonogram prací je odvozen od termínu podpisu Smlouvy a závisí na splnění předpokladů a součinnosti na straně Objednatele.

	Část plnění	Trvání	Předpokládané datum ukončení
1.	Etapa I	1,5 měsíce	Do 2 měsíců od podpisu smlouvy
2.	Etapa II	4 měsíce	Do 6 měsíců od podpisu smlouvy
3.	Etapa III	1 měsíc	Do 6 měsíců od akceptace výstupů Etapy I - analytické dokumentace (v závislosti na ostatních podmínkách nutných pro provedení testů)
4.	Etapa IV	1 měsíc	Do 8 měsíců od podpisu smlouvy resp. do dvou týdnů od ukončení Etapy III pokud budou splněny nezbytné podmínky a předpoklady realizace
5.	Etapa V	1 měsíc	Do 9 měsíců od podpisu smlouvy resp. do 1 měsíce od ukončení etapy IV.

Předpokládaný konkrétní harmonogram plnění aktualizovaný na základě rozšíření předmětu plnění o Změny ve VIS MAIL II požadované Objednatelem pro spuštění VIS MAIL II do provozu:

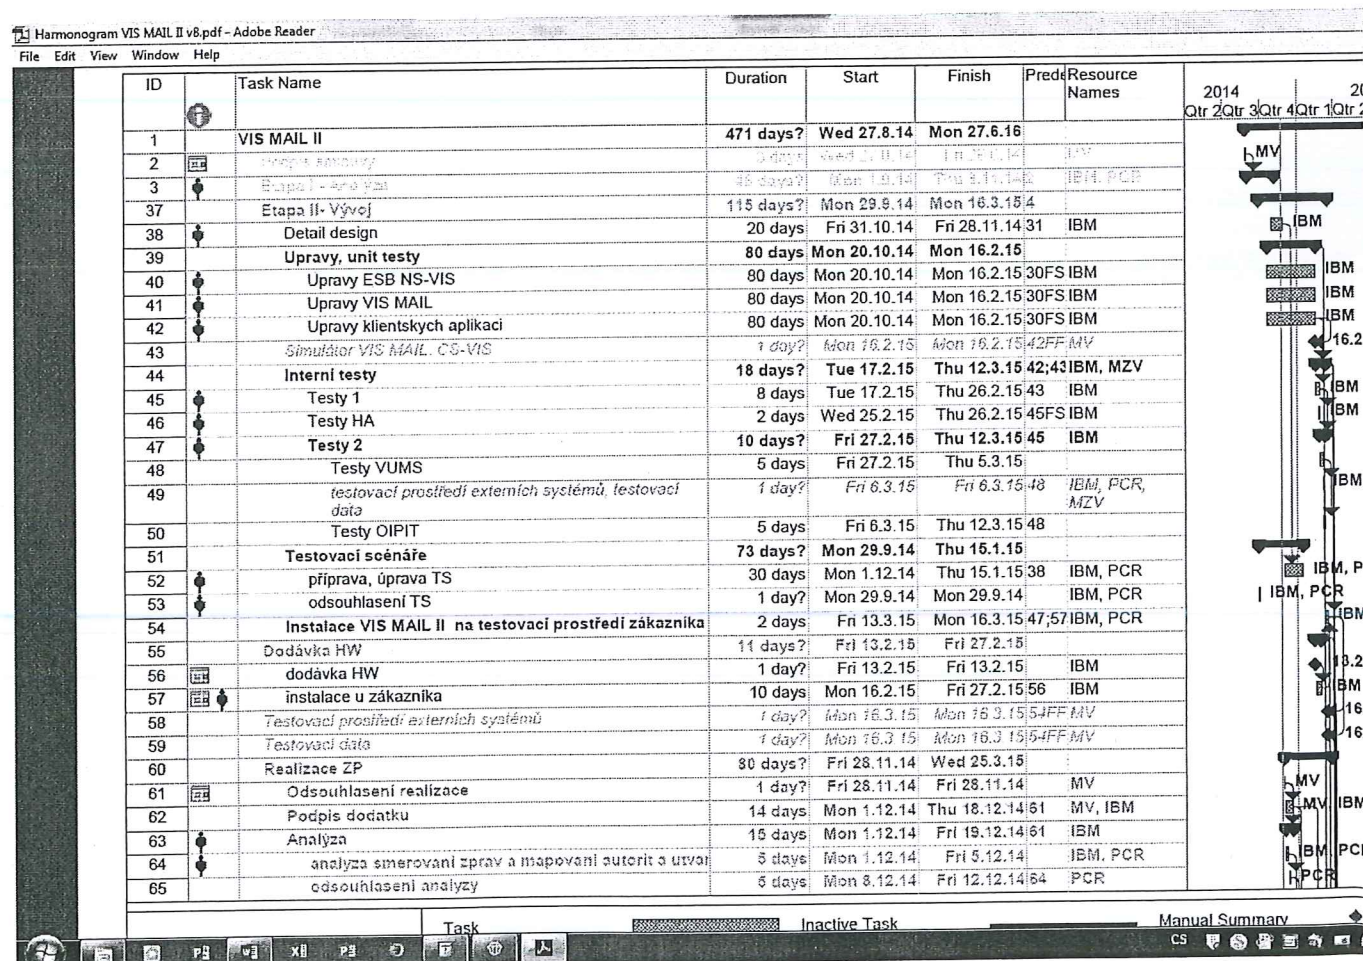

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Resource Names	2014	2015
66	analýza ostatních změn	5 days	Mon 8.12.14	Fri 12.12.14	IBM, PCR	Qtr 2	Qtr 1
67	odsouhlasení ostatních změn	5 days	Mon 15.12.14	Fri 19.12.14	PCR	Qtr 2	Qtr 1
68	Vývoj ZP	57 days	Mon 22.12.14	Mon 16.3.15		Qtr 2	Qtr 1
69	směrování zpráv a mapování autorit a útvarů	8 days	Mon 22.12.14	Tue 6.1.15	65;62	Qtr 2	Qtr 1
70	ostatní změny	20 days	Tue 17.2.15	Mon 16.3.15	67;35	Qtr 2	Qtr 1
71	testy	7 days	Tue 17.3.15	Wed 26.3.15	44;76	Qtr 2	Qtr 1
72	Etapa III - testování u zákazníka	23 days	Thu 26.3.15	Mon 27.4.15	56;58	Qtr 2	Qtr 1
73	Součinnost externí systémů: PCR, CIS, ICIS, CS-VIS, VIS MAIL, MZV, BIS, Kodex	20 days	Thu 26.3.15	Wed 22.4.15	56	Qtr 2	Qtr 1
74	testování zhotovitele	13 days	Thu 26.3.15	Mon 13.4.15	IBM, PCR, MZV	Qtr 2	Qtr 1
75	testování věcného gestora	10 days	Tue 31.3.15	Mon 13.4.15	55;71	Qtr 2	Qtr 1
76	aktualizace dokumentace	15 days	Thu 26.3.15	Wed 15.4.15	44	Qtr 2	Qtr 1
77	příprava overení distribuce	10 days	Tue 14.4.15	Mon 27.4.15	75	Qtr 2	Qtr 1
78	Testovací data	1 day	Tue 14.4.15	Tue 14.4.15	75	Qtr 2	Qtr 1
79	Akceptační testování	10 days	Tue 14.4.15	Mon 27.4.15	75	Qtr 2	Qtr 1
80	Etapa IV - integrační testy	23 days	Tue 28.4.15	Mon 1.6.15	79	Qtr 2	Qtr 1
81	příprava testů	2 days	Tue 28.4.15	Wed 29.4.15	79	Qtr 2	Qtr 1
82	ověření	3 days	Thu 30.4.15	Tue 5.5.15	81	Qtr 2	Qtr 1
83	testy	10 days	Wed 6.5.15	Wed 20.5.15	82	Qtr 2	Qtr 1
84	vyhodnocení, úpravy	3 days	Thu 21.5.15	Mon 25.5.15	83	Qtr 2	Qtr 1
85	pretestování	5 days	Tue 26.5.15	Mon 1.6.15	84	Qtr 2	Qtr 1
86	Etapa V	280 days	Tue 2.6.15	Mon 27.6.15	86	Qtr 2	Qtr 1
87	příprava ukončení provozu	9 days	Tue 2.6.15	Fri 12.6.15	79	Qtr 2	Qtr 1
88	Součinnost externí systémů: PCR, CIS, ICIS, CS-VIS, VIS MAIL, MZV, BIS, Kodex	25 days	Tue 2.6.15	Mon 27.6.15	85	Qtr 2	Qtr 1
89	příprava provozu nového systému	9 days	Tue 2.6.15	Fri 12.6.15	79	Qtr 2	Qtr 1
90	Switch	3 days	Mon 15.6.15	Wed 17.6.15	87;89	Qtr 2	Qtr 1
91	podpora provozu	9 days	Thu 18.6.15	Tue 30.6.15	90	Qtr 2	Qtr 1
92	Ukončení projektu	1 day	Tue 30.6.15	Tue 30.6.15	91FF	Qtr 2	Qtr 1

Zhotovitel vyvine veškeré úsilí, aby Etapa IV předmětu plnění dle této Smlouvy byla realizována do konce Q1 2015 za podmínky, že Smlouva bude podepsána do poloviny srpna 2014 a že budou splněny Podmínky a předpoklady a součinnosti uvedené v této Smlouvě.

Práce mohou být realizovány ve výše uvedených termínech za předpokladu, že nedojde ke změně zadání ze strany Objednatel a že budou splněny Podmínky a předpoklady a součinnosti uvedené v této Smlouvě a to v požadovaných termínech.

V případě nedodržení výše uvedených termínů nebo neposkytnutí potřebné spolupráce, součinnosti ze strany Objednatel budou tyto termíny přiměřeně prodlouženy nebo posunuty.

Harmonogram může být upraven též na základě vzájemné písemné dohody.

Příloha č. B Dodatku č. 1

Příloha č. 5 – Detailní specifikace a podmínky plnění dílčí části: Změny ve VIS MAIL II požadované Objednatel pro spuštění VIS MAIL II do provozu

1.1 DETAILNÍ SPECIFIKACE

A) Funkcionalita Speciální storno

Tato funkcionalita Speciální storno (DiscontinueExamination):

- na konektoru doplněna operace pro speciální storno (DiscontinueExamination), která bude vázané na institut zastupování do stávajícího rozhraní pro MZV
- rozšíření rozhraní MZV NS-VIS o novou operaci **Speciální storno (DiscontinueExamination)**.
- vytvoření nová operace v CA **Speciální storno (DiscontinueExamination)**, která převede žádost na základě čísla ŽOV do koncového stavu DiscontinueExamination. Operace umožní změnit stav žádosti ZU a RepringZU. Operace bude využita v případě, kdy bude rozhodnuto o ukončení zastupování na ZÚ.
- zaslání informace do zastupovaného státu o ukončení zastupování a o předání zprávy zpět zastupovanému státu, pomocí zprávy VIS Mail typu 02 nebo 08. Zprávu bude zasílat operátor a napíše do ní informaci o předání zprávy zpět zastupovanému státu.

nebude realizována.

B) Interní směrování zpráv ve VIS MAIL

Směrování VIS Mail zpráv na základě autority.

Změna adresování se týká adresování příchozích zpráv, které jsou zpracovávány na VIS Mail aplikačním serveru.

Návrh řešení:

Jedná se úpravu scénáře SYS-222 Směřovat zprávu z VIS Mail, kdy výpočet směrování (pro zprávy typu 01 až 08) mezi MV a MZV bude prováděn dle typu autority (Authority.type) místo čísla ŽOV. Pokud bude Authority.type=01, systém označí zprávu: "pro MZV" jinak bude zpráva zpracovávána na MV.

Bude změněn způsob výpočtu položky **Vlastník**. Způsob výpočtu této položky je uveden ve scénáři SYS-222 níže.

Bude změněn způsob výpočtu položky **ZÚ**. Způsob výpočtu této položky je uveden ve scénáři SYS-222 níže.

Podrobný popis změny je níže ve scénáři SYS-222.

Změna nebude mít dopad na směrování zpráv uvnitř systému VIS Mail MZV (kde je již nyní implementováno směrování dle autority).

Další drobná změna bude ve scénářích:

OPE-211 - Prohlížet detail zprávy v historii zpráv

OPE-230 - Prohlížet detail zprávy na záložce VIS Mail 1

Bude provedena změna ve výpočtu viditelnosti tlačítek vytváření zprávy s totožným Referenčním číslem (Vlastník zprávy bude odpovídat přihlášenému uživateli).

SYS-222 - Směřovat zprávu z VIS Mail

Rozsah: Aplikace národního systému VIS Mail

Typ: Systém **Viditelnost:** Zvenku **Úroveň:** Podfunkce

Primární aktér: Systém

Předpoklady spuštění:

- Právě přijatá zpráva.

Hlavní úspěšný průběh:

1. Systém vyhodnotí typ zprávy

Systém vyplní položku Vlastník zprávy (Formulář detailu zprávy) kódem útvary (Číselník: Útvar).

2. Hodnotu získá na základě obsahu RecipientAuthority ze zprávy a to tak, že v číselníku Útvar najde shodnou Unit.authority a jí odpovídající Kód.

Rozšíření:

- 1a. Zpráva je typu 21 až 26:

1a1. Systém označí zprávu: "pro VISION"

1a2. Scénář skončí

- 1b. Zpráva je typu 88:

1b1. Systém označí zprávu: "pro Administrátora"

1b2. Scénář skončí

- 2a. Typ autority má hodnotu 01 Consular post:

2a1. Systém označí zprávu: "pro MZV"

Systém vyplní položku ZÚ na zprávě číselníkovou hodnotou Název (label) číselníku ZÚ.

2a2. Hodnotu získá na základě obsahu RecipientAuthority ze zprávy a to tak, že v číselníku ZÚ najde shodnou ZÚ.authority a jí odpovídající Název (label).

- 2b. Z obsahu RecipientAuthority nelze vyplnit obsah položky Vlastník

2b1. Systém zapíše do položky Vlastník zprávy (Formulář detailu zprávy) kód útvary pro zpracování neadresovatelných zpráv (Číselník: Útvar)

C) Automatická aktualizace zahraničních List of Authorities (LoA)

Uživatel obdrží nový LoA ve formátu SSV a nahraje ho do systému. Systém z nového souboru automaticky vyřadí duplicity, záznamům v aktivním LoA, které již nejsou v novém LoA, ukončí platnost. Systém porovná záznamy, které existují v aktivním LoA i v novém LoA a případně upraví jejich platnost. Záznamy, které neexistují v aktivním LoA a existují v novém LoA, přidá do aktivního LoA.

Automatická aktualizace se bude týkat všech záznamů v LoA vyjma záznamů České republiky, tu nebude možné aktualizovat tímto způsobem, protože na záznamy LoA se váží záznamy v číselníku ZÚ a číselníku OCP a navíc je zdrojem informací o LoA CZ. O provedené aktualizaci bude vytvořen report.

UC:

Vstupní podmínky:

Produkční systém obsahuje aktuální LoA.

Uživatel obdrží nové LoA ve formě SSV souboru.

Uživatel je přihlášen k KA Admin VISMail

Postup:

1. Uživatel zvolí operaci Aktualizace LoA
2. Uživatel nahraje soubor do systému
3. Uživatel spustí aktualizaci
4. Systém provede aktualizaci
5. Systém vypíše report.

Výstupní podmínky:

Aktualizovaný LoA

Report o aktualizaci

Popis algoritmu

Přípravné kroky – odstranění duplicit a CZ

1. Nahrání nové LoA do pracovní tabulky
2. Vyřazení záznamu CZ (aktualizace se bude týkat pouze jiných členských států)
3. Odstranění duplicit
 - a. Pro každý záznam se ověří, zdali existuje jiný výskyt v tabulce nové LoA. Pokud ano, odstraní se ten, který má kratší platnostUkončení platnosti záznamů v aktivní LoA, které nejsou v nové LoA nebo mají jinou platnost
4. Pro každý záznam z aktivní LoA se ověří, zdali existuje záznam v nové LoA
 - a. Pokud ne, ukončí se platnost záznamu v aktivní LoA
 - b. Pokud ano, ověří se, zdali má stejnou platnost. Pokud ne, upraví se tak, že se nastaví platnost z nové LoA.Nalezený záznam se vždy z pracovní LoA odstraní
Založení nových záznamů v aktivní LoA, které jsou v nové LoA
5. Pro každý záznam z nové LoA se ověří, zdali existuje v aktivní LoA
 - a. Pokud ne, založí se nový záznam v aktivní LoA dle záznamu v nové LoAVytvoření reportu
6. Je vytvořen report, který obsahuje seznam
 - a. záznamů s ukončenou platností
 - b. záznamů se změněnou platností
 - c. nových záznamů

Automatická aktualizace je ukončena

Poznámka: vyhledáním se rozumí porovnáním pětice polí LoA (MB, country, typ, place, name)

Předpokládáme řešení s použitím temp tabulky a uložené procedury, která na základě dat z temp tabulky provede aktualizaci T_AUTORITY. Výsledek zpracování bude uložený v tabulce výsledku zpracování, který administrátorská aplikace zobrazí a umožní její tisk.

D) Poštovní notifikace ve VIS Mail

Úprava VIS Mail aplikačního serveru, který v případě přijetí VIS Mail zprávy typu 01-08, která přísluší na území, vygeneruje notifikační poštovní zprávu a odešle tuto zprávu na definovanou adresu na SMTP server (Domino server).

MV musí zajistit SMTP přístup na příslušný SMTP server v poštovní síti MV. E-mailová adresa pro zaslání notifikace bude definována v parametrech systému.

Vytvoření nových a úprava stávajících automatických testů

E) Rozšíření VIS Mail o audit ws

Systém VISMAIL bude plnit auditní záznamy do tabulky auditních záznamů systému NS-VIS. Veškeré další činnosti s auditními záznamy bude provádět systém NS-VIS. Systém NS-VIS bude rovněž poskytovat uživatelské rozhraní pro přístup k auditním záznamům, a to v rozsahu současné funkcionality NS-VIS.

Administrátor systému bude mít možnost, prostřednictvím konfiguračního souboru, nastavit, které ws budou auditovány včetně obsahu, které ws budou auditovány bez obsahu a které ws budou z auditu vyjmuty.

Implementace s využitím auditního systému NSVIS - Plnění stávajících tabulek NS VIS a využití funkcionality NS VIS (administrační klient, parametry administračního klienta, fonetické tvary, vyhledávání dle XPATH)

- Implementace netransakčního napojení a zápisu do tabulky T_AUDIT v databázi systému NS VIS
- Implementace generování korelačních identifikátorů
- Implementace systému parametrů určujících jaké operace logovat v plném rozsahu, které logovat bez obsahu zprávy a které operace nelogovat

F) Prodloužení položky křestní jméno

Prodloužení položky křestní jméno (rozhraní s MZV)

Požadavek:

na prodloužení položek v rozhraní EVC 2-NS VIS:

Položka FirstName o délce 25 znaků bude prodloužena na 50 znaků.

Jedná se o typ <simpleType name="FirstNameType">.

Na rozhraní s MZV se používá v těchto zprávách:

- EVC2Message/ApplicationZURepring,
- EVC2Message/ApplicationLongZU,
- EVC2Message/ApplicationPermitType,
- EVC2Message/DepartureOrderType

Návrh řešení:

Položková struktura NS-VIS bude zvětšena na 50 znaků. Rozhraní se systémy, které umožňují předat položku FirstName, budou předávat tuto delší hodnotu. Rozhraní, které neumožňují předat prodlouženou položku, budou hodnotu ořezávat na 25 znaků.

Dopad řešení na straně NS VIS je do následujících částí systému:

CA – všechny operace, pracující s entitou Applicant, položka FirstName

DB – změna databázové položky FirstName v entitě Applicant

- migrace (transformace) všech uložených záznamů v produkčním systému (milióny záznamů)

KA Víza, Vyčkat – změna ve všech operacích, pracující s položkou FirstName (zejména validace)

- změna UI při zobrazování položky FirstName (seznam, detail)

Rozhraní MZV změna délky položky FirstName ve zprávách ApplicationZURepring, LongZU, PermitType, DepartureOrderType prodloužení na 50 znaků

V následujících rozhraních dojde k ořezu položky Křestní jméno (externí systém nepodporuje větší délku) a to takto:

- BIS – dávka EVA – délka křestní jméno bude nejvýše 25 znaků
- VISION – délka křestní jméno bude nejvýše 25 znaků
- Mobilní zařízení – součet FirstName, LastName a OtherName musí být menší než 125, FirstName bude nejvýše 25 znaků
- ISOP (OHP) – součet First + Last musí být menší než 65, (FirstName může mít až 50 znaků
- Pozn. CIS – již byl ořezáván na 24 znaků, bude zachováno.

V následujících rozhraních bude provedena úprava pro předání položky Křestní jméno v délce 50 znaků:


- ICIS (podporuje 100 znaků) – možná změna v operaci FindPerson prodloužení na 50 znaků
- CS-VIS (podporuje 150 znaků) – možná změna ve všech operacích, kde je FirstName prodloužením podporovaného řetězce na 50 znaků, jde o oba směry komunikace.
- SIS II (podporuje 100 znaků) - povolit předání FirstName prodloužením na 50 znaků

G) Mapování autorit a útvarů

Změna systému pro případ, kdy je více autorit pro jeden útvar.

Databáze

Změna se týká mapování tří číselníků – Orgán, Útvar a ZÚ.
Současné mapování číselníků je Orgán:Útvar 1:1 a Orgán:ZÚ 1:1
Bude změněno na mapování Orgán:Útvar 1:N a Orgán:ZÚ 1:N

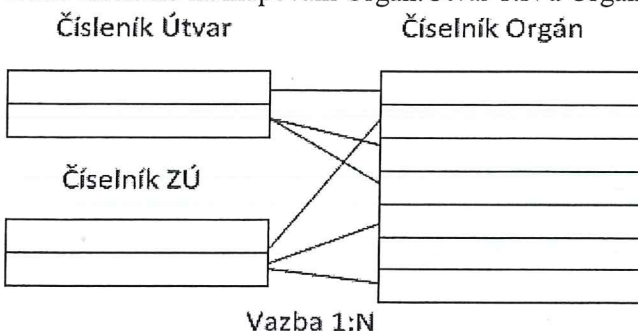

Administrace

Změna KA VIS Mail Admin

Současné řešení – při editaci záznamu číselníku Útvar (resp. číselníku ZÚ) se k útvaru přiřazen právě jeden záznam z číselníku LoA

Bude změněno tak, že při editaci záznamu číselníku LoA se bude přiřazovat k orgánu právě jeden záznam z číselníku útvar, nebo číselníku ZÚ.

Příchozí zpráva

Tato změna bude realizována současně se změnou interního směřování zpráv VIS Mail (viz. bod A tohoto dokumentu).

Dopad bude pouze na VIS Mail aplikační server.

Odchozí zpráva (Nová nebo odpověď)

Zvolená varianta na analytické schůzce:

Varianta A+

Systém nalezne všechny možné záznamy LoA odesílatele dle útvaru. Pro vyplnění do zprávy bude vybrána hodnota, která je nalezena první v tabulce prioritizací. Prioritizací se rozumí pořadí typu LoA (např. 003, 005, 006, 004 – pokud při více LoA existuje 003, použije se, pokud ne, zkoumá se další dle pořadí atd.)

Dopad bude pouze na VIS Mail aplikační server.

1.2 TERMÍNY PLNĚNÍ

Předmět plnění specifikovaný v čl. 1.1 této Přílohy č. 5 bude realizován postupně v následujících jednotlivých fázích:

Fáze I - Detailní analýza ZP

Fáze II - Vývoj

Fáze III- Testování

Předmět plnění bude předáván dle uvedených předpokládaných termínů nebo v termínech podle vzájemné písemné dohody.

	Fáze	Trvání	Předpokládané datum ukončení
1.	Fáze I – Analýza	1 měsíc	Měsíc od podpisu Dodatku č. 1
2.	Fáze II – Vývoj	3 měsíce	Do 4 měsíců od podpisu Dodatku č. 1
3.	Fáze III – Testování	1 měsíc	Do 6 měsíců od podpisu tohoto Dodatku č.1

Práce mohou být realizovány ve výše uvedených termínech za předpokladu, že nedojde ke změně zadání ze strany Objednatele a že budou dodrženy následující termíny zajištění/realizace podmínek a předpokladů (součinnost Objednatele):

- analýza funkcionalit interní směrování zpráv ve VIS MAIL a mapování autorit a útvarů bude provedena a odsouhlasena nejpozději do poloviny prosince 2014, analýza a odsouhlasení ostatních změn bude nejpozději do 23.12.2014
- zajištění testovacího prostředí a rozhraní dotčených externích systémů pro testy VIS MAIL II s externími systémy (zejména systémem CIS, MZV a centrálními systémy EU: CS-VIS, VIS MAIL) před zahájením testování tj. nejpozději do 20.3.2015
- v infrastruktuře Objednatele – OIPIT bude připraven SMTP server, nebo bude zajištěn přístup na příslušný SMTP server s možností odesílání mailové zprávy na definovanou adresu, bude zajištěna síťová konektivita smtp protokolu mezi aplikačním serverem VISMAIL a tímto SMTP serverem
- pro testy (interní testy Zhotovitele, testy Objednatele i akceptační testy) bude zajištěna součinnost jednoho z členských států EU

V případě zpoždění nebo neposkytnutí potřebné spolupráce či součinnosti ze strany Objednatele budou tyto termíny přiměřeně prodlouženy nebo posunuty.

1.3 PŘEJÍMKA

Objednatel potvrdí přejímku jednotlivých částí dílčího předmětu plnění dle čl. 1.1 této Přílohy č. 5 – Fází I-III dle čl. 1.2 této Přílohy č. 5 podpisem příslušného předávacího nebo akceptačního protokolu.

Předmět bude považován za řádně splněný, jestliže Zhotovitel úspěšně vykoná přejímací zkoušku – akceptaci provedením oboustranně schválených akceptačních testů, poskytnutím součinnosti Zhotovitele a předáním příslušné dokumentace Objednateli, tj. dodá předmět plnění podle zde uvedené specifikace.

Předmět akceptace je akceptován (Zhotovitel úspěšně vykoná přejímací zkoušku), pokud Objednatel nepodal žádné písemné námitky (výhrady) s uvedením položek, které obsahují závady typu A nebo B, a takovéto závady Zhotoviteli neprokázal v akceptačním protokolu. Postup při akceptaci je popsán v článku VI Smlouvy.

1.4 CENA A ZPŮSOB JEJÍHO PLACENÍ

Celková cena plnění specifikovaného v čl. 1.1 této Přílohy č. 5 je stanovena jako cena konečná a nepřekročitelná a činí 1 722 000,00 Kč (slovy: jeden milion sedm set dvacet dva tisíc korun českých) bez DPH.

Dále se smluvní strany dohodly, že nebude realizována funkcionality Speciální storno dle odstavce 1.5.3 Přílohy č. 1 Smlouvy.

	Cena bez DPH v Kč	DPH v %	DPH v Kč	Cena včetně DPH
Cena předmětu plnění dle čl. 1.1 této Přílohy	1 797 200,00	21%	377 412,00	2 174 612,00
Úspora nákladů za nerealizaci funkcionality Speciální storno dle	- 75 200,00	21%	15 792,00	90 992,00

odstavce 1.5.3 Přílohy č.1				
Celková cena dílčí části plnění	1 722 000,00	21%	361 620,00	2 083 620,00

Výše uvedená cena obsahuje všechny náklady související se splněním předmětu plnění specifikovaného v čl. 1.1 této Přílohy č. 5 a všechny náklady související s realizací zde specifikovaných dodávek a služeb.

Členění úhrady výše stanovené ceny podle jednotlivých fází:

	Cena bez DPH v Kč	DPH v %	DPH v Kč	Cena včetně DPH
20% z celkové ceny služeb po ukončení Fáze I: akceptaci aktualizované analytické dokumentace	344 400,00	21%	72 324,00	416 724,00
50% z celkové ceny služeb po ukončení Fáze II: instalaci funkcionalit specifikovaných v čl. 1.1 této Přílohy č. 5 na testovací prostředí Objednatele	861 000,00	21%	180 810,00	1 041 810,00
30% z celkové ceny služeb po ukončení Fáze III: akceptaci systému VIS MAIL II dle odstavce 1.3 této Přílohy č.5 a čl. VI Smlouvy	516 600,00	21%	108 486,00	625 086,00

Úhrada ceny za plnění bude realizována dílčími fakturami po splnění jednotlivých fází na základě předávacího protokolu podepsaného vedoucími projektu Zhotovitele a Objednatele.

Úhrada ceny za poslední fázi bude realizována fakturou na základě akceptačního protokolu podepsaného vedoucími projektu Zhotovitele a Objednatele.

Datem zdanitelného plnění jednotlivých fází bude datum splnění příslušné fáze tj. datum podpisu příslušného protokolu. Zhotovitel je povinen, po vzniku práva fakturovat, vystavit a Objednateli předat do 5 pracovních dnů ode dne splnění příslušné fáze fakturu ve dvojím vyhotovení.

1.5 SANKCE

Smluvní pokuta dle článku XII Smlouvy se pro předmět plnění dle čl. 1.1 této Přílohy č. 5 neuplatní.

1.6 SOUČINNOST OBJEDNATELE

Objednatel nese odpovědnost za správnost obsahu existujících dat a číselníků.

Objednatel poskytne potřebné specifikace a vysvětlení požadavků pro vypracování detailní analýzy změn včetně nezbytných konzultací k těmto specifikacím a požadavkům.

Objednatel se zavazuje dodržovat termíny uvedené v této Příloze č. 5 a detailním harmonogramu realizace.

Následující činnosti jsou plně v zodpovědnosti Objednatele:

- akceptační testy,

- zajištění případných změn, testů na straně externích systémů a provozu dle harmonogramu.
