

**Dodatek č.2**

**ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 28.8.2014**

(dále jen „Smlouva“)

Číslo smlouvy/dodatku Objednatele: PPR-32148-32/ČJ-2013-990656 (ve znění Dodatku č. 1)

Číslo smlouvy/dodatku Zhotovitele: CWR023/2

Smluvní strany:

**Česká republika – Ministerstvo vnitra**

Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

IČO: 00007064

DIČ: CZ00007064

Bankovní spojení: ČNB Praha 1

Číslo účtu: 5504881/0710

Zastoupená: Ing. Miroslavem Hajným, ředitelem Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR

(dále jen „MV ČR“ nebo „Objednatel“)

a

**IBM Česká republika, spol. s r.o.**

V Parku 2294/4, 148 00 Praha 4

Registovaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 692

IČO: 14890992

DIČ: CZ14890992

Bankovní spojení: ČSOB Praha 1, Na příkopě 14, Praha 1

Číslo účtu: 56733/0300

zastoupená: Radkem Hovorkou, jednatelem společnosti

(dále jen „IBM“ nebo „Zhotovitel“)

**Vzhledem k tomu, že** dojde k posunu termínů tzv. roll out všech členských států schengenského prostoru a tedy spuštění centrálního VIS MAIL II do provozu (připojení systému VIS MAIL II do centrálního relay serveru VIS mail EU), dohodly se smluvní strany v souladu s ustanovením článku III bodu 3 a článku XI. Smlouvy na jejích následujících změnách, přičemž objem služeb a cena předmětu plnění zůstávají zachovány a nemění se:

a) Poslední odstavec bodu 3 čl. II Předmět smlouvy se nahrazuje novým zněním:

**Etapa V – Provoz**

**1. část**

- Příprava ukončení provozu dosavadního systému NS-VIS.
- Přenesení provozu systému – spuštění VIS MAIL II.
- Nezbytná podpora provozu po dobu 1 týdne

**2. část**

- Nezbytná podpora provozu připojení systému VIS MAIL II do centrálního relay serveru VIS mail EU po dobu 1 týdne

b) Odstavec 3 čl. III Místo a termín plnění se nahrazuje novým zněním:

Realizace předmětu plnění bude probíhat po jednotlivých částech, resp. etapách. Předpokládané rámcové termíny plnění jsou uvedeny v Příloze č. 2 této Smlouvy. Pokud nebude realizace Etapy V, 1. část ukončena nejpozději do 10 měsíců od podpisu smlouvy z důvodů na straně Objednatele, budou termín a podmínky dokončení předmětu plnění znovu projednány a stanoveny v dodatku této smlouvy. Etapa V 2. část bude spuštěna současně s připojením systému VIS MAIL II do centrálního relay serveru VIS mail EU.

c) Článek VII Cena a platební podmínky se nahrazuje novým zněním

1. Celková cena za předmět plnění dle čl. II této Smlouvy činí **30 524 702,00 Kč** bez DPH (slovy třicet milionů pět set dvacet čtyři tisíc sedm set dva korun)

výše DPH činí: 21 %, tj. **6 410 187,42 Kč**.

**tj. 36 934 889,42 Kč** včetně DPH

(slovy třicet šest milionů devět set třicet čtyři tisíc osm set osmdesát devět korun 42 haléřů)

|                                                                                                                                   | <b>Cena bez DPH v Kč</b> | <b>DPH v %</b> | <b>DPH v Kč</b>     | <b>Cena včetně DPH</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|------------------------|
| Cena za předmět realizace beze změn ve VIS MAIL II požadované objednatelem pro spuštění VIS MAIL II do provozu (dle Dodatku č. 1) | 28 802 702,00            | 21%            | 6 048 567,42        | 34 851 269,42          |
| Cena dílčí části plnění Změny ve VIS MAIL II požadované objednatelem pro spuštění VIS MAIL II do provozu (dle Dodatku č. 1)       | 1 722 000,00             | 21%            | 361 620,00          | 2 083 620,00           |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                     | <b>30 524 702,00</b>     | <b>21%</b>     | <b>6 410 187,42</b> | <b>36 934 889,42</b>   |

Cena jednotlivých etap realizace předmětu plnění a jednotkové ceny dodávaného Hardware jsou uvedeny v Příloze č. 5 Cenová informace.

2. Výše uvedená cena obsahuje všechny náklady související se splněním předmětu plnění a všechny náklady související s realizací zde specifikovaných Dodávek a Služeb.

Úhrada výše stanovené celkové ceny za předmět plnění bude provedena následujícím způsobem:

- i) za předmět plnění beze změn ve VIS MAIL II požadované objednatelem pro spuštění VIS MAIL II do provozu (dle Dodatku č. 1) na základě realizace jednotlivých etap:

|                                                                                                                                                                         | Cena bez<br>DPH v Kč | DPH<br>v % | DPH v Kč            | Cena včetně DPH      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|---------------------|----------------------|
| 20 % z celkové ceny služeb po realizaci<br>Etapy I - akceptaci analytické<br>dokumentace aktualizovaných a nových<br>dokumentů uvedených v bodě 3<br>Předmětu smlouvy   | 5 677 777,00         | 21%        | 1 192 333,17        | 6 870 110,17         |
| 50 % z celkové ceny služeb po realizaci<br>Etapy II a Etapy III - akceptaci systému<br>VIS MAIL II dle bodu VI smlouvy                                                  | 14 194 443,00        | 21%        | 2 980 833,03        | 17 175 276,03        |
| <u>Dodávka Hardware</u>                                                                                                                                                 | <u>413 816,00</u>    |            | <u>86 901,36</u>    | <u>500 717,36</u>    |
| <i>z toho</i>                                                                                                                                                           |                      |            |                     |                      |
| <i>8 ks disků</i>                                                                                                                                                       | <i>189 744,00</i>    |            | <i>39 846,24</i>    | <i>229 590,24</i>    |
| <i>2 ks servery</i>                                                                                                                                                     | <i>224 072,00</i>    | 21%        | <i>47 055,12</i>    | <i>271 127,12</i>    |
| 29 % z celkové ceny služeb po realizaci<br>Etapy IV a Etapy V 1. část - předání<br>díla, systému VIS MAIL II do provozu                                                 | 8 232 777,00         | 21%        | 1 728 883,17        | 9 961 660,17         |
| 1 % z celkové ceny služeb po ukončení<br>Etapy V, 2. část – ukončení podpory<br>provozu po připojení systému VIS<br>MAIL II do centrálního relay serveru<br>VIS mail EU | 283 889,00           | 21%        | 59 616,69           | 343 505,69           |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                                           | <b>28 802 702,00</b> | <b>21%</b> | <b>6 048 567,42</b> | <b>34 851 269,42</b> |

- ii) za dílčí část plnění Změny ve VIS MAIL II požadované objednatelem pro spuštění VIS MAIL II do provozu dle jednotlivých fází tohoto dílčího plnění:

|                                                                                                                                                                                                        | Cena bez<br>DPH v Kč | DPH<br>v % | DPH v Kč          | Cena včetně<br>DPH  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-------------------|---------------------|
| 20 % z ceny služeb za dílčí část<br>plnění Změny ve VIS MAIL II po<br>ukončení Fáze I: akceptaci<br>aktualizované analytické<br>dokumentace                                                            | 344 400,00           | 21%        | 72 324,00         | 416 724,00          |
| 50 % z ceny služeb za dílčí část<br>plnění Změny ve VIS MAIL II po<br>ukončení Fáze II: instalaci<br>funkcionalit specifikovaných v čl.<br>1.1 této Přílohy č. 5 na testovací<br>prostředí Objednatele | 861 000,00           | 21%        | 180 810,00        | 1 041 810,00        |
| 30 % z ceny služeb za dílčí část<br>plnění Změny ve VIS MAIL II po<br>ukončení Fáze III: akceptaci<br>systému VIS MAIL II dle odstavce<br>1.3 této Přílohy č. 5 a čl. VI<br>Smlouvy                    | 516 600,00           | 21%        | 108 486,00        | 625 086,00          |
| <b>Celkem za dílčí část plnění</b>                                                                                                                                                                     | <b>1 722 000,00</b>  | <b>21%</b> | <b>361 620,00</b> | <b>2 083 620,00</b> |

3. Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Pokud se DPH na základě nové právní úpravy během smluvního období změní, výše DPH se automaticky změní v souladu s touto právní úpravou. V takovém případě Zhotovitel vyúčtuje výše uvedenou cenu bez DPH a připočítá DPH v příslušné zákonem stanovené výši. Tato změna nebude považována za změnu ceny ani za změnu této Smlouvy.
4. Úhrada ceny za předmět plnění bude realizována fakturami dle specifikovaných platebních milníků na základě Předávacího nebo Akceptačního protokolu podepsaného vedoucími Projektu Objednatele a Zhotovitele, kterým bude potvrzena kompletnost dodaného milníku.
5. Datem zdanitelného plnění bude datum podpisu příslušného Akceptačního protokolu, Předávacího protokolu, příp. dodacího listu či datum splnění příslušné části plnění. Zhotovitel je povinen po vzniku práva fakturovat, vystavit a Objednateli předat do 5 pracovních dnů ode dne podpisu příslušného protokolu fakturu ve dvojím vyhotovení. Zálohové platby Objednatel neposkytuje.
6. Faktury musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména náležitosti daňového dokladu stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a obchodní listiny stanovené v § 435 zákona; kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat označení (faktura), číslo Smlouvy, označení bankovního účtu Zhotovitele, datum jejího vystavení, název a sídlo Zhotovitele a Objednatele (Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7) a příjemce faktury (Policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečení, Odbor správy majetku, P.O.BOX 6, 150 05 Praha 5), cenu bez daně z přidané hodnoty, procentní sazbu a výši daně z přidané hodnoty a cenu včetně daně z přidané hodnoty; výše daně z přidané hodnoty bude zaokrouhlena na celé desetihaléře nahoru. Každá faktura bude vyhotovena ve 2 výtiscích (originál + 1 kopie). Součástí faktury bude příslušný Předávací nebo Akceptační protokol.
7. Splatnost faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení Objednateli.
8. Objednatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti, není doložena kopií požadovaných dokladů, nebo která obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh Dodávky než dohodnuté v této Smlouvě s tím, že doba splatnosti nové (opravené) faktury začíná znovu běžet ode dne jejího opětovného prokazatelného doručení Objednateli.
9. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
10. V případě prodlení Objednatele s úhradou fakturované ceny si Zhotovitel vyhrazuje právo účtovat za každý den prodlení úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. Bude-li faktura Zhotovitelem doručena Objednateli v období mezi 8. 12. příslušného roku a 29. 2. následujícího roku, nebude pro toto období Zhotovitelem účtován Objednateli úrok z prodlení s platbou ani nebude prodlení Objednatele s platbou v tomto období důvodem pro odstoupení Zhotovitele od této Smlouvy dle bodu 3 čl. XIII Smlouvy ani k pozastavení prací dle následujícího článku.
11. Jestliže Objednatel nesplní své platební závazky v souladu s termínem uvedeným v této Smlouvě, a to ani po písemném upozornění Zhotovitelem, bude Zhotovitel oprávněn pozastavit dodávku plnění až do zaplacení splatné pohledávky nebo si vzít bez jakékoli odpovědnosti za případné škody zpět dodané nezaplacené Produkty, Programy, Materiály i další dodané položky a zároveň využít jiných právních prostředků.
12. V případě pozastavení plnění z důvodů prodlení s platbou ze strany Objednatele nebude toto považováno za prodlení Zhotovitele s plněním podle této Smlouvy.

d) Odstavec 20 čl. XVII Všeobecná ustanovení se nahrazuje novým zněním:

20. Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří Přílohy 1 až 7:

Příloha č. 1: Detailní specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2: Rámcové termíny plnění

Příloha č. 3: Řídící struktura Projektu a řízení Projektu

Příloha č. 4: Součinnost Objednatele

Příloha č. 5: Cenová informace

Příloha č. 6: Detailní specifikace a podmínky plnění dílčí části Změny ve VIS MAIL II požadované Objednatelem pro spuštění VIS MAIL II do provozu

Příloha č. 7: Detailní specifikace zprovoznění systému VIS MAIL II

e) Příloha č. 2 Smlouvy - „Rámcové termíny plnění“, se nahrazuje novým zněním, které je uvedeno v Příloze A tohoto Dodatku č. 2.

Příloha č. 5 Smlouvy – „Cenová informace“, se nahrazuje novým zněním, které je uvedeno v Příloze B tohoto Dodatku č. 2.

Příloha č. 5 Smlouvy – „Detailní specifikace a podmínky plnění dílčí části Změny ve VIS MAIL II požadované Objednatelem pro spuštění VIS MAIL II do provozu“, která je Přílohou B Dodatku č. 1 se stává Přílohou č. 6 Smlouvy a je uvedena v Příloze C tohoto Dodatku č. 2.

Přílohu D tohoto Dodatku č. 2 tvoří nová Příloha č. 7 Smlouvy – „Detailní specifikace zprovoznění systému VIS MAIL II“.

f) Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a všechny její přílohy zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčeny.

g) Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel obdrží po dvou (2) stejnopisech tohoto Dodatku č. 2.

h) Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a stává se nedílnou součástí Smlouvy.

Za Zhotovitele:



Podpis oprávněného zástupce


Radek Hovorka

19-05-2015

Jméno

Datum

Za Objednatele:



Podpis oprávněného zástupce

Ing. Miroslav Hajný

22-05-2015

Jméno

Datum

IBM Česká republika, spol. s r. o.

V Parku 2294/4

148 00 Praha 4 (37)

IČ: 14890992, DIČ: CZ14890992

## Příloha A Dodatku č. 2

### Příloha č. 2 - Rámcové termíny plnění

Rámcový harmonogram prací je odvozen od termínu podpisu Smlouvy a závisí na splnění předpokladů a součinnosti na straně Objednatele.

|    | Část plnění     | Trvání     | Předpokládané datum ukončení                                                                                                           |
|----|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Etapa I         | 1,5 měsíce | Do 2 měsíců od podpisu smlouvy                                                                                                         |
| 2. | Etapa II        | 4 měsíce   | Do 6 měsíců od podpisu smlouvy                                                                                                         |
| 3. | Etapa III       | 1 měsíc    | Do 6 měsíců od akceptace výstupů Etapy I - analytické dokumentace (v závislosti na ostatních podmínkách nutných pro provedení testů)   |
| 4. | Etapa IV        | 1 měsíc    | Do 8 měsíců od podpisu smlouvy resp. do dvou týdnů od ukončení Etapy III pokud budou splněny nezbytné podmínky a předpoklady realizace |
| 5. | Etapa V, 1.část | 1 měsíc    | Do 9 měsíců od podpisu smlouvy resp. do 1 měsíce od ukončení etapy IV.                                                                 |
| 6. | Etapa V, 2.část | 1 týden    | Do 14 dní od připojení systému VIS MAIL II do centrálního relay serveru VIS mail EU                                                    |

Předpokládaný konkrétní harmonogram plnění aktualizovaný na základě rozdělení Etapy V na dvě části:

| ID  | Task Name                                           | Duration  | Start       | Finish      | Predecessor Names | 2014                                                       | 2015 | 2016 |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------|------|------|
|     |                                                     |           |             |             |                   | Qtr 2Qtr 3Qtr 4Qtr 1Qtr 2Qtr 3Qtr 4Qtr 1Qtr 2Qtr 3Qtr 4Qtr |      |      |
| 1   | VIS MAIL II                                         | 474 days? | Wed 27.8.14 | Thu 30.6.16 |                   |                                                            |      |      |
| 2   | ✓                                                   |           |             |             |                   |                                                            |      |      |
| 3   | ✓                                                   | 48 days?  | Mon 1.9.14  | Thu 5.11.14 | IBM, PCR          |                                                            |      |      |
| 37  | ✓                                                   |           |             |             |                   |                                                            |      |      |
| 56  | ✓                                                   | 4 days?   | Thu 4.9.14  | Fri 4.9.14  |                   |                                                            |      |      |
| 59  |                                                     | 1 day?    | Mon 1.9.14  | Mon 1.9.14  |                   |                                                            |      |      |
| 60  |                                                     | 1 day?    | Mon 1.9.14  | Mon 1.9.14  |                   |                                                            |      |      |
| 61  | ✓                                                   | 3 days?   | Fri 28.1.14 | Tue 24.3.15 |                   |                                                            |      |      |
| 73  | Etapa III - testování u zákazníka                   | 15 days?  | Wed 25.3.15 | Thu 14.5.15 | 56:58             |                                                            |      |      |
| 74  | ✓                                                   | 34 days   | Wed 25.3.15 | Wed 13.5.15 | 59                |                                                            |      |      |
| 75  |                                                     | 20 days   | Wed 25.3.15 | Tue 7.4.15  | IBM, PCR, MV, MZV |                                                            |      |      |
| 81  |                                                     | 1 day?    | Mon 1.9.14  | Mon 1.9.14  |                   |                                                            |      |      |
| 82  |                                                     | 12 days   | Thu 14.5.15 | Fri 24.4.15 | 56                |                                                            |      |      |
| 83  |                                                     | 15 days   | Wed 25.3.15 | Tue 14.4.15 | 54                |                                                            |      |      |
| 84  |                                                     | 10 days   | Mon 27.4.15 | Tue 12.5.15 | 53                |                                                            |      |      |
| 85  |                                                     | 1 day?    | Mon 27.4.15 | Mon 27.4.15 | 52                |                                                            |      |      |
| 86  |                                                     | 4 days    | Wed 22.4.15 | Mon 22.4.15 | 50                |                                                            |      |      |
| 87  | Akceptační testování                                | 10 days   | Wed 29.4.15 | Thu 14.5.15 | 82                |                                                            |      |      |
| 88  | AT prostředí VIS Mail1                              | 3 days    | Wed 29.4.15 | Mon 4.5.15  | 86FS              |                                                            |      |      |
| 89  | AT cílový stav VIS MAIL II (simulátor/členský stát) | 7 days    | Tue 5.5.15  | Thu 14.5.15 | 88                |                                                            |      |      |
| 90  | Etapa IV - integrační testy                         | 19 days   | Fri 15.5.15 | Wed 10.6.15 | 87                |                                                            |      |      |
| 91  | příprava testů                                      | 2 days    | Fri 15.5.15 | Mon 18.5.15 | 89                |                                                            |      |      |
| 92  | ověření,                                            | 2 days    | Tue 19.5.15 | Wed 20.5.15 | 91                |                                                            |      |      |
| 93  | testy                                               | 8 days    | Thu 21.5.15 | Mon 1.6.15  | 92                |                                                            |      |      |
| 94  | vyhodnocení, upravy, performance test               | 3 days    | Tue 2.6.15  | Thu 4.6.15  | 93                |                                                            |      |      |
| 95  | Testy paralelní provoz, přechody                    | 5 days    | Tue 2.6.15  | Mon 8.6.15  | 93                |                                                            |      |      |
| 96  | pretestování                                        | 4 days    | Fri 5.6.15  | Wed 10.6.15 | 94                |                                                            |      |      |
| 97  | Etapa V (a)                                         | 276 days  | Thu 11.6.15 | Thu 30.6.16 | 96                |                                                            |      |      |
| 98  | příprava ukončení provozu                           | 7 days    | Thu 11.6.15 | Fri 19.6.15 | 87                |                                                            |      |      |
| 99  | ✓                                                   | 21 days   | Thu 11.6.15 | Thu 30.6.16 | 96                |                                                            |      |      |
| 100 | ✓                                                   | 7 days    | Thu 11.6.15 | Fri 19.6.15 | 87                |                                                            |      |      |

| ID  | Task Name                      | Duration | Start       | Finish      | Predecessors | Resource Names | 2014               | 2015                |
|-----|--------------------------------|----------|-------------|-------------|--------------|----------------|--------------------|---------------------|
|     |                                |          |             |             |              |                | Qtr 2Qtr 3Qtr 4Qtr | 1Qtr 2Qtr 3Qtr 4Qtr |
| 101 | Switch                         | 2 days   | Mon 22.6.15 | Tue 23.6.15 | 98, 101      | IBM, PCR       |                    | IBM, PCR            |
| 102 | podpora provozu                | 5 days   | Wed 24.6.15 | Tue 30.6.15 | 101          | IBM            |                    | IBM                 |
| 103 | Ukončení projektu              | 1 day?   | Tue 30.6.15 | Tue 30.6.15 | 102          |                |                    | 30.6                |
| 104 |                                |          |             |             |              |                |                    |                     |
| 105 | Etapa V (b) - paralelní provoz | 4 days   | Wed 20.1.16 | Mon 25.1.16 |              |                |                    |                     |
| 106 | podpora provozu                | 4 days   | Wed 20.1.16 | Mon 25.1.16 |              |                |                    |                     |

Práce mohou být realizovány ve výše uvedených termínech za předpokladu, že nedojde ke změně zadání ze strany Objednatele a že budou splněny Podmínky a předpoklady a součinnosti uvedené v této Smlouvě a to v požadovaných termínech.

V případě nedodržení výše uvedených termínů nebo neposkytnutí potřebné spolupráce, součinnosti ze strany Objednatele budou tyto termíny přiměřeně prodlouženy nebo posunuty.

Harmonogram může být upraven též na základě vzájemné písemné dohody.

**Příloha B Dodatku č. 2**
**Příloha č. 5 - Cenová informace**

Členění ceny za předmět plnění beze změn ve VIS MAIL II požadované objednatelem pro spuštění VIS MAIL II do provozu (dle Dodatku č.1) podle jednotlivých částí, etap:

| Jednotlivé Etapy (části) předmětu plnění                            | Cena bez DPH v Kč    | DPH v %    | DPH v Kč            | Cena včetně DPH      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|---------------------|----------------------|
| Etapa I: Analýza (příprava, analýza, design)                        | 5 677 777,00         | 21%        | 1 192 333,17        | 6 870 110,17         |
| Etapa II: Vývoj (modifikace, úpravy systémů, interní testy)         | 11 282 737,00        | 21%        | 2 369 374,77        | 13 652 111,77        |
| Etapa III: Testování (testování věcného gestora, AT)                | 2 911 706,00         | 21%        | 611 458,26          | 3 523 164,26         |
| Etapa IV: Integrační testy s EU (Testování VIS MAIL II s CS-VIS EU) | 4 258 333,00         | 21%        | 894 249,93          | 5 152 582,93         |
| Etapa V 1. část: Provoz (příprava provozu, spuštění VIS MAIL II)    | 3 974 444,00         | 21%        | 834 633,24          | 4 809 077,24         |
| Etapa V 2. část                                                     | 283 889,00           | 21%        | 59 616,69           | 343 505,69           |
| Dodávka Hardware                                                    | 413 816,00           | 21%        | 86 901,36           | 500 717,36           |
| <b>Celková cena</b>                                                 | <b>28 802 702,00</b> | <b>21%</b> | <b>6 048 567,42</b> | <b>34 851 269,42</b> |

Cena Hardware:

| Hardware - položky                                                                                               | Cena bez DPH v Kč | DPH v % | DPH v Kč  | Cena včetně DPH |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------|-----------------|
| 4 ks (42D0767) IBM 2TB 3.5in HS 7.2K 6Gbps NL SAS HDD – produkční prostředí                                      |                   |         |           |                 |
| 1 disk                                                                                                           | 36 468,00         | 21%     | 7 658,28  | 44 126,28       |
| 1 disk                                                                                                           | 36 468,00         | 21%     | 7 658,28  | 44 126,28       |
| 1 disk                                                                                                           | 36 468,00         | 21%     | 7 658,28  | 44 126,28       |
| 1 disk                                                                                                           | 36 468,00         | 21%     | 7 658,28  | 44 126,28       |
| 4 ks (42D0767) IBM 2TB 3.5in HS 7.2K 6Gbps NL SAS HDD – testovací prostředí                                      |                   |         |           |                 |
| 1 disk                                                                                                           | 10 968,00         | 21%     | 2 303,28  | 13 271,28       |
| 1 disk                                                                                                           | 10 968,00         | 21%     | 2 303,28  | 13 271,28       |
| 1 disk                                                                                                           | 10 968,00         | 21%     | 2 303,28  | 13 271,28       |
| 1 disk                                                                                                           | 10 968,00         | 21%     | 2 303,28  | 13 271,28       |
| 1ks (7875A3G) IBM BladeServer HS23, Xeon 4C E5-2609v2 80W 2.5GHz/1333MHz/10MB, 8GB, O/Bay 2.5in SAS, obsahující: | 113 884,00        | 21%     | 23 915,64 | 137 799,64      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |            |                  |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------------|-------------------|
| - 1x (42D0777) IBM 1TB 3.5in HS 7.2K 6Gbps NL SAS HDD.<br>- 1x (46W0708) 8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.35V) PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz VLP RDIMM.<br>- 2x (90Y8926) IBM 146 GB 2.5in SFF Slim-HS 10K 6Gbps SAS HDD.<br>- 1x (43W4068) SAS Connectivity Card (CIOv) for IBM BladeCenter.                                                 |                   |            |                  |                   |
| 1ks (7875A3G) IBM BladeServer HS23, Xeon 4C E5-2609v2 80W 2.5GHz/1333MHz/10MB, 8GB, O/Bay 2.5in SAS, obsahující:<br>- 1x (42D0777) IBM 1TB 3.5in HS 7.2K 6Gbps NL SAS HDD.<br>- 1x (46W0708) 8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.35V) PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz VLP RDIMM.<br>- 2x (90Y8926) IBM 146 GB 2.5in SFF Slim-HS 10K 6Gbps SAS HDD. | 110 188,00        | 21%        | 23 139,48        | 133 327,48        |
| <b>Dodávka Hardware celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>413 816,00</b> | <b>21%</b> | <b>86 901,36</b> | <b>500 717,36</b> |

Členění za dílčí část plnění Změny ve VIS MAIL II požadované objednatelem pro spuštění VIS MAIL II do provozu dle jednotlivých fází tohoto dílčího plnění:

|                                                                                                                                                                                        | <b>Cena bez DPH v Kč</b> | <b>DPH v %</b> | <b>DPH v Kč</b>   | <b>Cena včetně DPH</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|------------------------|
| 20 % z ceny služeb za dílčí část plnění Změny ve VIS MAIL II po ukončení Fáze I: akceptaci aktualizované analytické dokumentace                                                        | 344 400,00               | 21%            | 72 324,00         | 416 724,00             |
| 50 % z ceny služeb za dílčí část plnění Změny ve VIS MAIL II po ukončení Fáze II: instalaci funkcionalit specifikovaných v čl. 1.1 této Přílohy č.5 na testovací prostředí Objednatele | 861 000,00               | 21%            | 180 810,00        | 1 041 810,00           |
| 30 % z ceny služeb za dílčí část plnění Změny ve VIS MAIL II po ukončení Fáze III: akceptaci systému VIS MAIL II dle odstavce 1.3 této Přílohy č.5 a čl. VI Smlouvy                    | 516 600,00               | 21%            | 108 486,00        | 625 086,00             |
| <b>Celkem za dílčí část plnění</b>                                                                                                                                                     | <b>1 722 000,00</b>      | <b>21%</b>     | <b>361 620,00</b> | <b>2 083 620,00</b>    |

## Příloha C Dodatku č. 2

### Příloha č. 6 – Detailní specifikace a podmínky plnění dílčí části: Změny ve VIS MAIL II požadované Objednatel pro spuštění VIS MAIL II do provozu

#### A) Funkcionalita Speciální storno

Tato funkcionalita Speciální storno (DiscontinueExamination):

- na konektoru doplněna operace pro speciální storno (DiscontinueExamination), která bude vázané na institut zastupování do stávajícího rozhraní pro MZV
- rozšíření rozhraní MZV NS-VIS o novou operaci **Speciální storno (DiscontinueExamination)**.
- vytvoření nová operace v CA **Speciální storno (DiscontinueExamination)**, která převede žádost na základě čísla ŽOV do koncového stavu DiscontinueExamination. Operace umožní změnit stav žádosti ZU a RepringZU. Operace bude využita v případě, kdy bude rozhodnuto o ukončení zastupování na ZÚ.
- zaslání informace do zastupovaného státu o ukončení zastupování a o předání zprávy zpět zastupovanému státu, pomocí zprávy VIS Mail typu 02 nebo 08. Zprávu bude zasílat operátor a napíše do ní informaci o předání zprávy zpět zastupovanému státu.

nebude realizována.

#### B) Interní směřování zpráv ve VIS MAIL

Směřování VIS Mail zpráv na základě autority.

Změna adresování se týká adresování příchozích zpráv, které jsou zpracovávány na VIS Mail aplikačním serveru.

Návrh řešení:

Jedná se úpravu scénáře SYS-222 Směřovat zprávu z VIS Mail, kdy výpočet směřování (pro zprávy typu 01 až 08) mezi MV a MZV bude prováděn dle typu autority (Authority.type) místo čísla ŽOV. Pokud bude Authority.type=01, systém označí zprávu: "pro MZV" jinak bude zpráva zpracovávána na MV.

Bude změněn způsob výpočtu položky **Vlastník**. Způsob výpočtu této položky je uveden ve scénáři SYS-222 níže.

Bude změněn způsob výpočtu položky **ZÚ**. Způsob výpočtu této položky je uveden ve scénáři SYS-222 níže.

Podrobný popis změny je níže ve scénáři SYS-222.

Změna nebude mít dopad na směřování zpráv uvnitř systému VIS Mail MZV (kde je již nyní implementováno směřování dle autority)

Další drobná změna bude ve scénářích:

OPE-211 - Prohlížet detail zprávy v historii zpráv

OPE-230 - Prohlížet detail zprávy na záložce VIS Mail 1

Bude provedena změna ve výpočtu viditelnosti tlačítek vytváření zprávy s totožným Referenčním číslem (Vlastník zprávy bude odpovídat přihlášenému uživateli).

SYS-222 - Směřovat zprávu z VIS Mail

**Rozsah:** Aplikace národního systému VIS Mail

**Typ:** Systém **Viditelnost:** Zvenku **Úroveň:** Podfunkce

**Primární aktér:** Systém

**Předpoklady spuštění:**

- Právě přijatá zpráva.

**Hlavní úspěšný průběh:**

1. Systém vyhodnotí typ zprávy

- Systém vyplní položku [Vlastník zprávy \(Formulář detailu zprávy\)](#) kódem [útvary \(Číselník: Útvar\)](#).
2. Hodnotu získá na základě obsahu RecipientAuthority ze zprávy a to tak, že v číselníku Útvar najde shodnou Unit.authority a jí odpovídající Kód.

#### Rozšíření:

- 1a. Zpráva je typu 21 až 26:
- 1a1. Systém označí zprávu: "pro VISION"
  - 1a2. Scénář skončí
- 1b. Zpráva je typu 88:
- 1b1. Systém označí zprávu: "pro Administrátora"
  - 1b2. Scénář skončí
- 2a. Typ authority má hodnotu 01 Consular post:
- 2a1. Systém označí zprávu: "pro MZV"  
Systém vyplní položku ZÚ na zprávě číselníkovou hodnotou Název (label) číselníku ZÚ.
  - 2a2. Hodnotu získá na základě obsahu RecipientAuthority ze zprávy a to tak, že v číselníku ZÚ najde shodnou ZÚ.authority a jí odpovídající Název (label).
- 2b. Z obsahu RecipientAuthority nelze vyplnit obsah položky Vlastník
- 2b1. Systém запиše do položky [Vlastník zprávy \(Formulář detailu zprávy\)](#) kód [útvary pro zpracování neadresovatelných zpráv \(Číselník: Útvar\)](#)

#### C) Automatická aktualizace zahraničních List of Authorities (LoA)

Uživatel obdrží nový LoA ve formátu SSV a nahraje ho do systému. Systém z nového souboru automaticky vyřadí duplicity, záznamům v aktivním LoA, které již nejsou v novém LoA, ukončí platnost. Systém porovná záznamy, které existují v aktivním LoA i v novém LoA a případně upraví jejich platnost. Záznamy, které neexistují v aktivním LoA a existují v novém LoA, přidá do aktivního LoA.

Automatická aktualizace se bude týkat všech záznamů v LoA vyjma záznamů České republiky, tu nebude možné aktualizovat tímto způsobem, protože na záznamy LoA se váží záznamy v číselníku ZÚ a číselníku OCP a navíc je zdrojem informací o LoA CZ. O provedené aktualizaci bude vytvořen report.

UC:

Vstupní podmínky:

Produkční systém obsahuje aktuální LoA.

Uživatel obdrží nové LoA ve formě SSV souboru.

Uživatel je přihlášen k KA Admin VISMai

Postup:

1. Uživatel zvolí operaci Aktualizace LoA
2. Uživatel nahraje soubor do systému
3. Uživatel spustí aktualizaci
4. Systém provede aktualizaci
5. Systém vypíše report.

Výstupní podmínky:

Aktualizovaný LoA

Report o aktualizaci

Popis algoritmu

Přípravné kroky – odstranění duplicit a CZ

1. Nahrání nové LoA do pracovní tabulky
2. Vyřazení záznamu CZ (aktualizace se bude týkat pouze jiných členských států)
3. Odstranění duplicit

- a. Pro každý záznam se ověří, zdali existuje jiný výskyt v tabulce nové LoA. Pokud ano, odstraní se ten, který má kratší platnost
- Ukončení platnosti záznamů v aktivní LoA, které nejsou v nové LoA nebo mají jinou platnost
4. Pro každý záznam z aktivní LoA se ověří, zdali existuje záznam v nové LoA
    - a. Pokud ne, ukončí se platnost záznamu v aktivní LoA
    - b. Pokud ano, ověří se, zdali má stejnou platnost. Pokud ne, upraví se tak, že se nastaví platnost z nové LoA.
- Nalezený záznam se vždy z pracovní LoA odstraní
- Založení nových záznamů v aktivní LoA, které jsou v nové LoA
5. Pro každý záznam z nové LoA se ověří, zdali existuje v aktivní LoA
    - a. Pokud ne, založí se nový záznam v aktivní LoA dle záznamu v nové LoA
- Vytvoření reportu
6. Je vytvořen report, který obsahuje seznam
    - a. záznamů s ukončenou platností
    - b. záznamů se změněnou platností
    - c. nových záznamů

Automatická aktualizace je ukončena

Poznámka: vyhledáním se rozumí porovnáním pěti polí LoA (MB, country, typ, place, name)

Předpokládáme řešení s použitím temp tabulky a uložené procedury, která na základě dat z temp tabulky provede aktualizaci T\_AUTORITY. Výsledek zpracování bude uložený v tabulce výsledku zpracování, který administrátorská aplikace zobrazí a umožní její tisk.

#### **D) Poštovní notifikace ve VIS Mail**

Úprava VIS Mail aplikačního serveru, který v případě přijetí VIS Mail zprávy typu 01-08, která přísluší na území, vygeneruje notifikační poštovní zprávu a odešle tuto zprávu na definovanou adresu na SMTP server (Domino server).

MV musí zajistit SMTP přístup na příslušný SMTP server v poštovní síti MV. E-mailová adresa pro zaslání notifikace bude definována v parametrech systému.

Vytvoření nových a úprava stávajících automatických testů

#### **E) Rozšíření VIS Mail o audit ws**

Systém VISMAIL bude plnit auditní záznamy do tabulky auditních záznamů systému NS-VIS. Veškeré další činnosti s auditními záznamy bude provádět systém NS-VIS. Systém NS-VIS bude rovněž poskytovat uživatelské rozhraní pro přístup k auditním záznamům, a to v rozsahu současné funkcionality NS-VIS.

Administrátor systému bude mít možnost, prostřednictvím konfiguračního souboru, nastavit, které ws budou auditovány včetně obsahu, které ws budou auditovány bez obsahu a které ws budou z auditu vyjmuty.

Implementace s využitím auditního systému NSVIS - Plnění stávajících tabulek NS VIS a využití funkcionality NS VIS (administrační klient, parametry administračního klienta, fonetické tvary, vyhledávání dle XPATH)

- Implementace netransakčního napojení a zápisu do tabulky T\_AUDIT v databázi systému NS VIS
- Implementace generování korelačních identifikátorů
- Implementace systému parametrů určujících jaké operace logovat v plném rozsahu, které logovat bez obsahu zprávy a které operace nelogovat

#### **F) Prodloužení položky křestní jméno**

Prodloužení položky křestní jméno (rozhraní s MZV)

Požadavek:

na prodloužení položek v rozhraní EVC 2-NS VIS:

Položka FirstName o délce 25 znaků bude prodloužena na 50 znaků.

Jedná se o typ <simpleType name="FirstNameType">.

Na rozhraní s MZV se používá v těchto zprávách:

- EVC2Message/ApplicationZURepring,
- EVC2Message/ApplicationLongZU,
- EVC2Message/ApplicationPermitType,
- EVC2Message/DepartureOrderType

Návrh řešení:

Položková struktura NS-VIS bude zvětšena na 50 znaků. Rozhraní se systémy, které umožňují předat položku FirstName, budou předávat tuto delší hodnotu. Rozhraní, které neumožňují předat prodlouženou položku, budou hodnotu ořezávat na 25 znaků.

Dopad řešení na straně NS VIS je do následujících částí systému:

**CA** – všechny operace, pracující s entitou Applicant, položka FirstName

**DB** – změna databázové položky FirstName v entitě Applicant

- migrace (transformace) všech uložených záznamů v produkčním systému (milióny záznamů)

**KA Víza, Vyčkat** – změna ve všech operacích, pracující s položkou FirstName (zejména validace)

- změna UI při zobrazování položky FirstName (seznam, detail)

**Rozhraní MZV** změna délky položky FirstName ve zprávách ApplicationZURepring, LongZU, PermitType, DepartureOrderType prodloužení na 50 znaků

**V následujících rozhraních dojde k ořezu položky Křestní jméno (externí systém nepodporuje větší délku) a to takto:**

- BIS – dávka EVA – délka křestní jméno bude nejvýše 25 znaků
- VISION – délka křestní jméno bude nejvýše 25 znaků
- Mobilní zařízení – součet FirstName, LastName a OtherName musí být menší než 125, FirstName bude nejvýše 25 znaků
- ISOP (OHP) – součet First + Last musí být menší než 65, ( FirstName může mít až 50 znaků
- Pozn. CIS – již byl ořezáván na 24 znaků, bude zachováno.

V následujících rozhraních bude provedena úprava pro předání položky Křestní jméno v délce 50 znaků:

- ICIS (podporuje 100 znaků) – možná změna v operaci FindPerson prodloužení na 50 znaků
- CS-VIS (podporuje 150 znaků) – možná změna ve všech operacích, kde je FirstName prodloužením podporovaného řetězce na 50 znaků, jde o oba směry komunikace.
- SIS II (podporuje 100 znaků) - povolit předání FirtsName prodloužením na 50 znaků

### G) Mapování autorit a útvarů


**Změna systému pro případ, kdy je více autorit pro jeden útvar.**

Databáze

Změna se týká mapování tří číselníků – Orgán, Útvar a ZÚ.

Současné mapování číselníků je Orgán:Útvar 1:1 a Orgán:ZÚ 1:1

Bude změněno na mapování Orgán:Útvar 1:N a Orgán:ZÚ 1:N

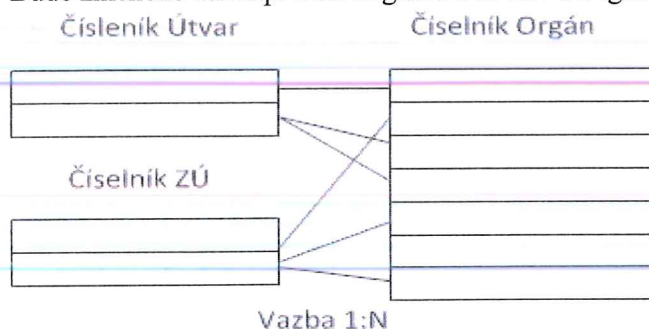

Administrace

## Změna KA VIS Mail Admin

Současné řešení – při editaci záznamu číselníku Útvar (resp. číselníku ZÚ) se k útvaru přiřazen právě jeden záznam z číselníku LoA

Bude změněno tak, že při editaci záznamu číselníku LoA se bude přiřazovat k orgánu právě jeden záznam z číselníku útvar, nebo číselníku ZÚ.

### Příchozí zpráva

Tato změna bude realizována současně se změnou interního směřování zpráv VIS Mail (viz bod A tohoto dokumentu).

Dopad bude pouze na VIS Mail aplikační server.

Odchozí zpráva (Nová nebo odpověď)

Zvolená varianta na analytické schůzce:

### Varianta A+

Systém nalezne všechny možné záznamy LoA odesílatele dle útvaru. Pro vyplnění do zprávy bude vybrána hodnota, která je nalezena první v tabulce prioritizací. Prioritizací se rozumí pořadí typu LoA (např. 003, 005, 006, 004 – pokud při více LoA existuje 003, použije se, pokud ne, zkoumá se další dle pořadí atd.)

Dopad bude pouze na VIS Mail aplikační server.

## 1.2 TERMÍNY PLNĚNÍ

Předmět plnění specifikovaný v čl. 1.1 této Přílohy č. 5 bude realizován postupně v následujících jednotlivých fázích:

Fáze I - Detailní analýza ZP

Fáze II - Vývoj

Fáze III - Testování

Předmět plnění bude předáván dle uvedených předpokládaných termínů nebo v termínech podle vzájemné písemné dohody.

|    | Fáze                 | Trvání   | Předpokládané datum ukončení               |
|----|----------------------|----------|--------------------------------------------|
| 1. | Fáze I – Analýza     | 1 měsíc  | Měsíc od podpisu Dodatku č. 1              |
| 2. | Fáze II – Vývoj      | 3 měsíce | Do 4 měsíců od podpisu Dodatku č. 1        |
| 3. | Fáze III – Testování | 1 měsíc  | Do 6 měsíců od podpisu tohoto Dodatku č. 1 |

Práce mohou být realizovány ve výše uvedených termínech za předpokladu, že nedojde ke změně zadání ze strany Objednatele a že budou dodrženy následující termíny zajištění/realizace podmínek a předpokladů (součinnost Objednatele):

- analýza funkcionalit interního směřování zpráv ve VIS MAIL a mapování autorit a útvarů bude provedena a odsouhlasena nejpozději do poloviny prosince 2014, analýza a odsouhlasení ostatních změn bude nejpozději do 23.12.2014
- zajištění testovacího prostředí a rozhraní dotčených externích systémů pro testy VIS MAIL II s externími systémy (zejména systémem CIS, MZV a centrálními systémy EU: CS-VIS, VIS MAIL) před zahájením testování tj. nejpozději do 20.3.2015
- v infrastruktuře Objednatele – OIPIT bude připraven SMTP server, nebo bude zajištěn přístup na příslušný SMTP server s možností odesílání mailové zprávy na definovanou adresu, bude zajištěna síťová konektivita smtp protokolu mezi aplikačním serverem VISMAIL a tímto SMTP serverem
- pro testy (interní testy Zhotovitele, testy Objednatele i akceptační testy) bude zajištěna součinnost jednoho z členských států EU

V případě zpoždění nebo neposkytnutí potřebné spolupráce či součinnosti ze strany Objednatele budou tyto termíny přiměřeně prodlouženy nebo posunuty.

### 1.3 PŘEJÍMKA

Objednatel potvrdí přejímku jednotlivých částí dílčího předmětu plnění dle čl. 1.1 této Přílohy č. 5 – Fází I-III dle čl. 1.2 této Přílohy č. 5 podpisem příslušného předávacího nebo akceptačního protokolu.

Předmět bude považován za řádně splněný, jestliže Zhotovitel úspěšně vykoná přejímací zkoušku – akceptaci provedením oboustranně schválených akceptačních testů, poskytnutím součinnosti Zhotovitele a předáním příslušné dokumentace Objednateli, tj. dodá předmět plnění podle zde uvedené specifikace.

Předmět akceptace je akceptován (Zhotovitel úspěšně vykoná přejímací zkoušku), pokud Objednatel nepodal žádné písemné námitky (výhrady) s uvedením položek, které obsahují závady typu A nebo B, a takovéto závady Zhotoviteli neprokázal v akceptačním protokolu. Postup při akceptaci je popsán v článku VI Smlouvy.

### 1.4 CENA A ZPŮSOB JEJÍHO PLACENÍ

Celková cena plnění specifikovaného v čl. 1.1 této Přílohy č. 5 je stanovena jako cena konečná a nepřekročitelná a činí 1 722 000,00 Kč (slovy: jeden milion sedm set dvacet dva tisíc korun českých) bez DPH.

Dále se smluvní strany dohodly, že nebude realizována funkcionality Speciální storno dle odstavce 1.5.3 Přílohy č. 1 Smlouvy.

|                                                                                              | Cena bez DPH v Kč   | DPH v %    | DPH v Kč          | Cena včetně DPH     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------------|---------------------|
| Cena předmětu plnění dle čl. 1.1 této Přílohy                                                | 1 797 200,00        | 21%        | 377 412,00        | 2 174 612,00        |
| Úspora nákladů za nerealizaci funkcionality Speciální storno dle odstavce 1.5.3 Přílohy č. 1 | - 75 200,00         | 21%        | 15 792,00         | 90 992,00           |
| <b>Celková cena dílčí části plnění</b>                                                       | <b>1 722 000,00</b> | <b>21%</b> | <b>361 620,00</b> | <b>2 083 620,00</b> |

Výše uvedená cena obsahuje všechny náklady související se splněním předmětu plnění specifikovaného v čl. 1.1 této Přílohy č. 5 a všechny náklady související s realizací zde specifikovaných dodávek a služeb.

Členění úhrady výše stanovené ceny podle jednotlivých fází:

|                                                                                               | Cena bez DPH v Kč | DPH v % | DPH v Kč   | Cena včetně DPH |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------|-----------------|
| 20 % z celkové ceny služeb po ukončení Fáze I: akceptaci aktualizované analytické dokumentace | 344 400,00        | 21%     | 72 324,00  | 416 724,00      |
| 50 % z celkové ceny služeb po ukončení Fáze II: instalaci                                     | 861 000,00        | 21%     | 180 810,00 | 1 041 810,00    |

|                                                                                                                                   |            |     |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------------|------------|
| funkcionalit specifikovaných v čl. 1.1 této Přílohy č.5 na testovací prostředí Objednatele                                        |            |     |            |            |
| 30 % z celkové ceny služeb po ukončení Fáze III: akceptaci systému VIS MAIL II dle odstavce 1.3 této Přílohy č.5 a čl. VI Smlouvy | 516 600,00 | 21% | 108 486,00 | 625 086,00 |

Úhrada ceny za plnění bude realizována dílčími fakturami po splnění jednotlivých fází na základě předávacího protokolu podepsaného vedoucími projektu Zhotovitele a Objednatele.

Úhrada ceny za poslední fázi bude realizována fakturou na základě akceptačního protokolu podepsaného vedoucími projektu Zhotovitele a Objednatele.

Datem zdanitelného plnění jednotlivých fází bude datum splnění příslušné fáze tj. datum podpisu příslušného protokolu. Zhotovitel je povinen, po vzniku práva fakturovat, vystavit a Objednateli předat do 5 pracovních dnů ode dne splnění příslušné fáze fakturu ve dvojím vyhotovení.

### 1.5 SANKCE

Smluvní pokuta dle článku XII Smlouvy se pro předmět plnění dle čl. 1.1 této Přílohy č. 5 neuplatní.

### 1.6 SOUČINNOST OBJEDNATELE

Objednatel nese odpovědnost za správnost obsahu existujících dat a číselníků.

Objednatel poskytne potřebné specifikace a vysvětlení požadavků pro vypracování detailní analýzy změn včetně nezbytných konzultací k těmto specifikacím a požadavkům.

Objednatel se zavazuje dodržovat termíny uvedené v této Příloze č. 5 a detailním harmonogramu realizace.

Následující činnosti jsou plně v zodpovědnosti Objednatele:

- akceptační testy,
- zajištění případných změn, testů na straně externích systémů a provozu dle harmonogramu.

### Příloha D Dodatku č. 2

#### Příloha č. 7 – Detailní specifikace zprovoznění systému VIS MAIL II

Zprovoznění systému VIS MAIL II proběhne jednorázově při nasazení systému do provozu. V jednotlivých fázích pak již bude probíhat pouze zapnutí/vypnutí konkrétních komunikačních kanálů (Vision, VIS MAIL) změnou parametru systému.

### PŘECHOD MEZI FÁZEMI

#### 1. Definice jednotlivých fází:

**Fáze 0** současný stav

konzultace probíhají přes VISION a VIS Mail (zprávy 01-08) se vyřizují samostatným web klientem

### Fáze 1 VISION

kompletní dodávka všech změn projektu VIS Mail 2 do produkčního provozu  
konzultace probíhají stále přes VISION, VIS Mail (zprávy 01-08) se vyřizují v KA Vyčkat a Víza  
stav od ukončení projektu v červnu 2015



### Fáze 2 Souběh


produkční provoz je převeden na souběžný provoz VISION a VIS Mail2  
nové konzultace probíhají přes VIS Mail 2, rozpracované konzultace se dokončí přes VISION  
na základě neoficiálních informací se přepnutí přesouvá pravděpodobně na leden 2016

### Fáze 3 VIS Mail2


produkční provoz je převeden pouze na VIS Mail2  
konzultace probíhají přes VIS Mail 2

## 2. Komunikace pro odchozí a příchozí konzultace dle fází

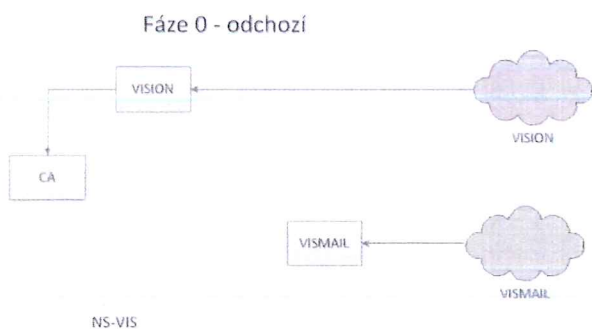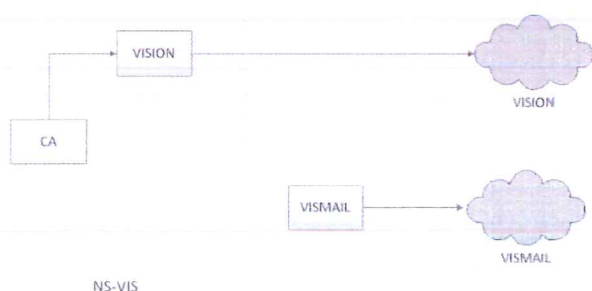


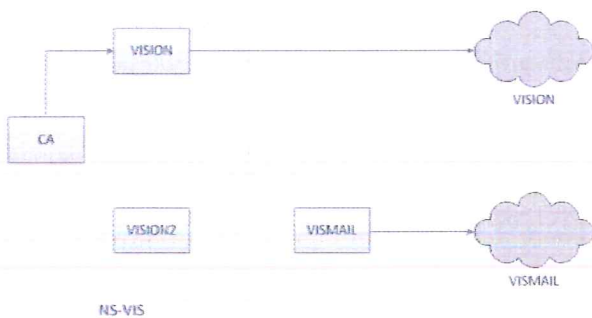


### Fáze 1 - odchozí

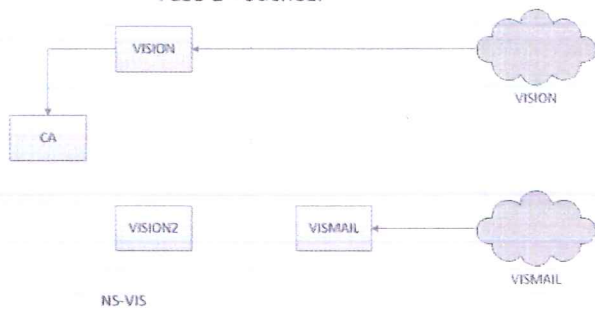

### Fáze 1 - příchozí

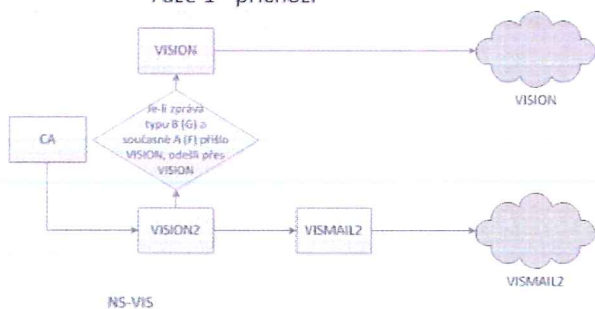

### Fáze 2 - odchozí

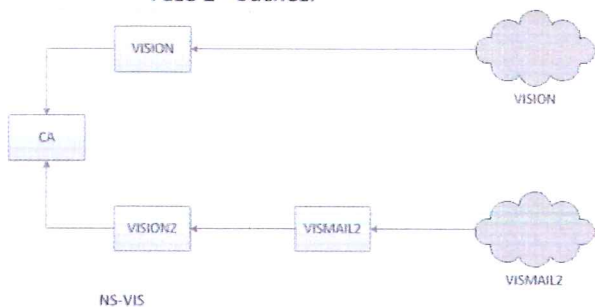

### Fáze 2 - příchozí

## 1. Nutné úpravy

Upravit stávající rozhraní VISION (ns-vis-vision), tak, aby bylo možné parametricky vypnout timery, které se starají o výběr příchozích zpráv a odesílání odchozích zpráv. Bude provedeno v rámci projektu.

## 2. Testování

Dodávaný systém v rámci projektu VIS Mail 2 (NS-VIS/VIS Mail) je nutné otestovat pro konzultace ve Fázi 1, Fázi 2 a Fázi 3. Tento test se bude týkat pouze konzultací a zastupování, tedy základních testů, kdy se pracuje s VISION Form A, B, C, F, G, H a VIS Mail zprávami 21,22,23,24,25 a 26.

Je nutné otestovat provedení přechodu mezi Fázemi.

Funkcionalita Fáze 3 (cílový stav) a Fáze 1 (funguje Vision a VIS Mail 1) budou testovány v rámci Etapy III – testování u Objednatele, a to jak během testování Zhotovitele resp. věcného gestora, tak v rámci AT.

Funkcionalita Fáze 2 (paralelní provoz) a testy přechodů mezi fázemi budou provedeny jako součást Etapy IV – integrační testy (nejlépe po provedení „oficiálních“ EU Lisa požadovaných integračních testů s Belgií).

### **Nezbytným předpokladem je**

Na straně EU se nebudou měnit IP adresy mailových serverů.

### Požadavek na Objednatele (podle aktuálního stavu)

Pro Etapu III

Je tedy nutno zajistit přístup jak do testovacího prostředí VIS MAIL II a součinnost některého z členských států pro testy cílové funkcionality (VISMAL II), tak do testovacího prostředí VIS Mail1 a členský stát (státy) pro testy funkcionality VIS Mail1. Předpokládáme/navrhujeme cca:

12.3.-20.3. testy proti simulátoru OIPIT

25.3.-27.3. testy proti simulátoru Olšanská

V týdnu 30.3. – 3.4. testování s členským státem (cílový stav VIS MAIL II)

6.-8.4. testy proti simulátoru Olšanská

9.-13.4. testy s členským státem VIS Mail1 v testovacím prostředí VIS Mail1

14.-16.4. AT s členským státem VIS Mail1 v testovacím prostředí VIS Mail1

17.- 20.4. AT se simulátorem (cílový stav VIS MAIL II)

21.-23.4. AT s členským státem (cílový stav VIS MAIL II)

24. a 27.4. AT se simulátorem, dokončení testů (cílový stav VIS MAIL II)

V Etapě IV integrační testy bude nutno zajistit členské státy (na stejný termín) - jeden, který bude zprávy posílat starým způsobem resp., který naposílá zprávy (Vision), aby dobehly starým způsobem, a jeden novým (VIS MAIL II) pro otestování paralelního provozu.
